UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

CRONOPROGRAMMA TAC POGGIO MIRTETO SU CONSIP - DGR 911-20 - pianificazione interventi

SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI

REGIONE LAZIO

n°	ATTIVITA'	Assegnata a	Inizio	fine
1	Nomina Rup e Dec ed impegno di spesa per la DGR 911-20 (Sandro Giugliano)	Ingegneria Biomedica Clinica		15.07.2022
2	Adesione all'accordo quadro su Consip (ormai è scaduto quello fatto da Sandro Giuliani)	Ingegneria Biomedica Clinica	15.07.2022	01.08.2022
3	Pre ordine di acquisto e sopralluoghi ditte	Ingegneria Biomedica Clinica	01.08.2022	30.08.2022
4	Conferma pre Ordine di acquisto (se procediamo su Consip entro 30 gg dal pre ordine)	Ingegneria Biomedica Clinica	30.08.2022	30.09.2022
5	Spostamento Servizio di Prevenzione ed adeguamento centrale termica	Ufficio Tecnico	30.08.2022	30.09.2022
6	Lavori edili impiantistici per lo spostamento (progetto 50.000) Fondi ASL	Ufficio Tecnico	30.08.2022	30.09.2022
7	Progetto per l'adeguamento dei locali che andranno ad accogliere la nuova TAC	Ufficio Tecnico	30.09.2022	30.11.2022
8	Completamento dei lavori edili ed impiantistici (ammonta a 450.000 €) Fondi ASL	Ufficio Tecnico	30.11.2022	30.03.2023
9	Istallazione e collaudo delle apparecchiature	Ingegneria Biomedica Clinica	30.03.2023	30.04.2023
10	Collegamento al RIS/PACS aziendale	Ingegneria Biomedica Clinica	30.03.2023	30.04.2023
11	Formazione al personale sanitario utilizzatore	Ingegneria Biomedica Clinica	30.03.2023	30.04.2023
Nota	Data attivazione prevista per il **02/05/2023**			

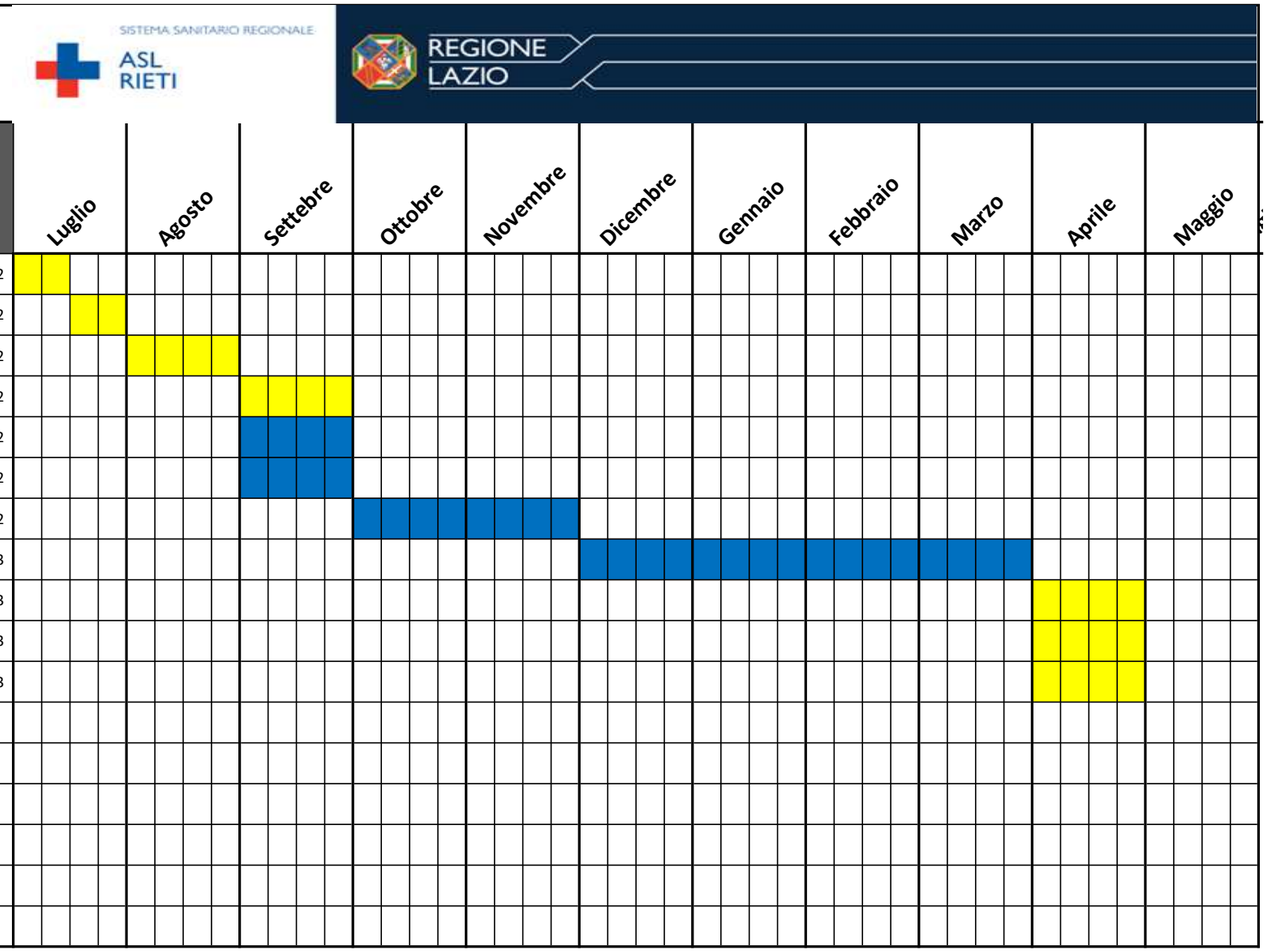

Legenda

- Attività della Centrale acquisti Regionale
- Attività dell'Ufficio Tecnico
- Attività dell'Ingegneria Biomedica Clinica

Documento firmato da:
Pace Erminio
08.08.2022 07:32:37 UTC
