



Progetto dei Fabbisogni per



Il presente Documento ha lo scopo di raccogliere le richieste dell'Amministrazione ASL Rieti contenute nel Piano dei Fabbisogni e formulare una proposta tecnico economica nel rispetto di quanto presente nella documentazione contrattuale.

	Nominativo	Ruolo	Data
Elaborazione	Stefano GUIDOTTI	Presale Manager	26/04/2022
Verifica	Fortunato FIMOGNARI	Responsabile Presale	26/04/2022
Approvazione	Danilo NICCOLINI	Responsabile Commerciale	26/04/2022

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	1 / 24

INDICE

0	Generalità	3
1	Progetto di Attuazione.....	6
2	Condizioni Economiche	19
3	Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensili	23
4	Pianificazione Temporale.....	24

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	2 / 24

0 Generalità

0.1 Applicabilità

Il documento si applica al progetto SPC relativo al Piano dei fabbisogni dell'Amministrazione in oggetto allegato al contratto [Rif. Piano Fabbisogni].

Il contratto in esecuzione è il Contratto esecutivo OPA relativo all'Appalto dei Servizi di Connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività [Rif. Contratto_esecutivo_OPA] stipulato tra FASTWEB e l'Amministrazione in oggetto.

0.2 Assunzioni

I servizi eventualmente presenti nel piano dei Fabbisogni [Rif. Piano Fabbisogni], la cui erogazione non è prevista nel presente progetto, saranno oggetto di versioni successive del presente progetto dei Fabbisogni, coerentemente con le esigenze dell'Amministrazione e qualora l'Amministrazione ne farà richiesta.

In tutto il documento, dove si fa riferimento a versioni di documentazione ufficiale o contrattuale e si indica tale versione con x.y (oppure AAAAMMGG nel caso del piano operativo) si identifica la versione del documento stesso sottintendendo la versione ultima del medesimo.

In tutto il documento, dove si fa riferimento genericamente all'Amministrazione, si intende l'Amministrazione "ASL Rieti".

0.3 Riferimenti

Codice	Identificativo	Descrizione
[1]	Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 - Schema di Contratto Quadro OPA	Schema di Contratto Quadro OPA
[2]	Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 bis - Schema di Contratto Esecutivo OPA	Schema di Contratto Esecutivo OPA
[3]	Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 5 - Capitolato Tecnico	Capitolato Tecnico
[4]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE	Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE
[5]	FW_SPCCONN2_03-TR-STD0-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STD0	Specifiche dei servizi di trasporto dati STD0

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	3 / 24

Codice	Identificativo	Descrizione
[6]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS	Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS
[7]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE	Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE
[8]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDO-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDO	Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDO
[9]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS	Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS
[10]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN	Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN
[11]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN	Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN
[12]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN	Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN
[13]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN	Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN
[14]	FW_SPCCONN2_04-DNS-SS_Specifiche dei servizi DNS	Specifiche dei servizi DNS
[15]	FW_SPCCONN2_04-DNS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi DNS	DNS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi DNS
[16]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SS_Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta VOIP	Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta VOIP
[17]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-TELP-SS_Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta TELP	Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta TELP
[18]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP	Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP
[19]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP	Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP
[20]	FW_SPCCONN2_07-SSUP_Specifiche dei servizi di supporto professionale	Specifiche dei servizi di supporto professionale
[21]	FW_SPCCONN2_08-SMG-NOC_Specifiche di realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC)	Specifiche di realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC)
[22]	FW_SPCCONN2_08-SMG-SOC_Specifiche di realizzazione e gestione del SOC	Specifiche di realizzazione e gestione del SOC
[23]	FW_SPCCONN2_08-SMG-PW_Specifiche di realizzazione e gestione del Sito Web SPC	Specifiche di realizzazione e gestione del Sito Web SPC
[24]	FW_SPCCONN2_08-SMG-SLMR_SLA Management & Reporting	SLA Management & Reporting
[25]	FW_SPCCONN2_02-SPC-PGE_Piano Generale per Erogazione dei Servizi	Piano Generale per Erogazione dei Servizi
[26]	FW_SPCCONN2_08-SMG-CQ_Specifiche di controllo qualità dei servizi	Specifiche di controllo qualità dei servizi
[27]	PEC ricevuta da ASL Rieti il 22/04/2022 avente come oggetto "ASL Rieti - Piano Fabbisogni Progetto SPC2 ver. 5.1"	Piano dei Fabbisogni dell'Amministrazione "ASL Rieti"
[28]	FW_SPCCONN2_DimensionamentoServizi	Dimensionamento dei servizi SPC per il Cliente "ASL Rieti"

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	4 / 24

Codice	Identificativo	Descrizione
[29]	FW_SPCCONN2_Progetto dei Fabbisogni	Progetto dei Fabbisogni dei servizi SPC per il Cliente "ASL Rieti"
[30]	FW_SPCCONN2_Piano di Attuazione	Piano di attuazione per il cliente "ASL Rieti"
[31]	FW_SPCCONN2_ChecklistAvvio	Checklist per la raccolta delle informazioni propedeutiche all'avvio dei servizi SPC per l'Amministrazione "ASL Rieti"

Tabella 1 – Riferimenti

0.4 Storia del Documento

Versione	Responsabile della modifica	Descrizione della modifica	Data
1.0	Danilo NICCOLINI	Prima emissione	19/05/2017
2.0	Danilo NICCOLINI	Ampliamento 10 sedi e dismissione 3 sedi	23/06/2020
3.0	Danilo NICCOLINI	N° 2 nuovi accessi Profilo STDE-A8 - 20480/1024 con backup LTE per Presidi Covid Rieti e Greccio	31/12/2020
3.1	Danilo NICCOLINI	N° 3 nuovi accessi Profilo STDE-A8 - 20480/1024 con backup LTE per Presidi Covid Rieti, Greccio e Cittaducale (sostituisce la ver 3.0)	25/01/2021
4.0	Danilo NICCOLINI	N° 9 nuovi accessi + n° 4 Upgrading + n° 3 cessazioni	04/06/2021
5.0	Danilo NICCOLINI	N° 2 nuovi accessi + n° 1 Upgrading con LTE + upgrading Internet da 100M ad 1G + cessazione 2 Centri Vaccinali	07/04/2022
5.1	Danilo NICCOLINI	N° 1 upgrading da profilo STDE-A8 - 20480/1024 a profilo STDE-S6 - 8192/8192 + n° 1 nuovo accesso profilo STDO-4 - 100 M	26/04/2022

Tabella 2 – Storia del Documento

0.5 Definizioni ed Acronimi

Acronimo	Descrizione
AGID	Agenzia per l'Italia Digitale
RTI	Raggruppamento Temporaneo d'Impresa
Servizio	Il termine Servizio coincide con il termine/concetto di sotto-progetto definito nella Procedura CNIPA relativa alla Gestione dei Requisiti.
SPC	Sistema Pubblico di Connettività
Amministrazione	INSERIRE
VPN	Virtual Private Network
CDE	Client Delivery Executive
SDE	Service Delivery Executive
PMLA	Project Manager Large Account

Tabella 3 – Acronimi

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	5 / 24

1 Progetto di Attuazione

1.1 Introduzione

Questo documento, come riportato nello scopo, raccoglie le richieste contenute nel Piano dei Fabbisogni del contratto esecutivo stipulato con l'Amministrazione [Rif. Annesso A - Piano Fabbisogni al contratto esecutivo]. In risposta a tali richieste e per tutti i servizi di Trasporto Dati, Sicurezza, Comunicazione Evoluta e Servizi Professionali in essi contenuti, il presente progetto ne formula una proposta tecnico economica. Tale proposta si integra con la documentazione prevista dal contratto quadro [Rif. Contratto quadro OPA/OPO relativo all'Appalto dei Servizi di Connettività e Sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività].

Il contenuto del documento recepisce quanto indicato nel capitolato tecnico [Rif. All. 2b alla lettera d'invito parag. 8.2.2].

I servizi oggetto della fornitura a cui ci si riferisce da Piano dei Fabbisogni sono i seguenti:

- **SERVIZI DI TRASPORTO DATI**
 - Servizio di trasporto dati Wired su portante Elettrica (STDE)
 - Servizio di trasporto dati Wired su portante Ottica (STDO)
 - Servizio di Banda Riservata (SBRI)

Di seguito gli altri servizi disponibili per eventuali ulteriori esigenze dell'Amministrazione:

- **SERVIZI DI TRASPORTO DATI**
 - Servizio di trasporto dati Wireless Satellitare (STDS)
- **SERVIZIO DI SICUREZZA**
 - Servizi di Sicurezza Perimetrale Unificata (SPUN)
 - Servizio di Sicurezza Centralizzata (SCEN)
- **SERVIZIO COMUNICAZIONE EVOLUTA**
 - Servizi Centralini IP (CEIP)
 - Servizi di Resilienza Periferici (RESI)
 - Servizi di Gateway (GWTD e GWIP)
 - Servizi di Gestione degli Endpoint (ENIP)
 - Servizi di Telepresenza
- **SERVIZI DI SUPPORTO PROFESSIONALE (SSUP)**
 - Servizio di Supporto Specialistico (SSUS)
 - Servizio di Formazione (FORM)

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	6 / 24

Nel dettaglio, il presente documento recepisce le nuove esigenze dell'Amministrazione che consistono nella variazione e aggiunta dei servizi sotto riportati, evidenziati in **GIALLO**:

NOTE DI VARIAZIONE PIANO FABBISOGNO	INDIRIZZO	Tecnologia Primario	Tecnologia Secondario	Tecnologia Backup	Backup Radiomobile	Profilo
Modificare link primario da profilo STDE-A8 - 20480/1024 a profilo STDE-S6 - 8192/8192	Palazzo Dosi - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 17 - RIETI	VULA FTTC		LTE	SI	STDE-S6 - 8192/8192
Nuovo accesso profilo STDO-4 - 100 M	Casa del Buon Pastore - VIA DEL TERMINILLO 63 - RIETI	Fibra ottica MOA GEA		LTE	SI	STDO-4 - 100 M

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	7 / 24

1.2 Descrizione della Architettura di Rete per i Servizi di Connettività

I servizi configurati in ambito SPC permetteranno la trasmissione di dati, inclusi immagini e fonia, e sono basati sul protocollo IP, conformi alle normative di riferimento IETF applicabili.

I servizi di trasporto descritti permettono all'Amministrazione la trasmissione/ricezione di pacchetti IP verso/da le 3 diverse tipologie di ambito previste, ed in particolare:

- **Intranet:** un ambito costituito dal dominio interno alla singola Amministrazione che connette tutte le sedi della stessa distribuite sul territorio;
- **Infranet:** un ambito costituito dal dominio comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni di interconnessione tramite IC SPC.
- **Internet:** un ambito di interazione tra le singole amministrazioni e gli utenti esterni ad esse fruitori dei servizi erogati dalle stesse.

I collegamenti fra le sedi sono realizzati in Virtual Private Network (VPN) per lo scambio di traffico IP e per la precisione verrà adottato il protocollo MPLS, descritto in sintesi nel presente documento.

1.3 Tecnologia utilizzata da Fastweb per i Servizi di Connettività

I servizi IP sono erogati previa verifica tecnica di fattibilità e copertura su tutto il territorio nazionale utilizzando le seguenti tipologie di portanti/tecnologie:

- Fibra Ottica
- FTTS (Fiber To The Street)
- VULA FTTCab
- SHDSL/HDSL
- ADSL
- Altre Tecnologie (es. ISDN, Satellitari, etc.)

L'utilizzo di una specifica tecnologia di accesso dipende dai servizi richiesti dall'Amministrazione, dalla banda necessaria presso la sede da collegare e dalla posizione geografica della sede stessa.

Nel seguito una breve panoramica delle principali peculiarità delle tecnologie di accesso disponibili.


Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	8 / 24

1.3.1 SERVIZI IN FIBRA

La Fibra Ottica è indispensabile per offrire servizi dati/voce/video integrati e scalabili a velocità da 10 Mbps a 10 Gbps. Le applicazioni tipiche sono il collegamento di siti di disaster recovery (con ripristino “a caldo” delle applicazioni delle Amministrazioni) o il raccordo dei siti Centri Stella di grosse reti. L'identico aspetto impatta le applicazioni Streaming Video, Voice over IP e Videocomunicazione che consumano grandi quantità di banda e garantiscono grossi risparmi in termini di ottimizzazione dei processi e delle infrastrutture di comunicazione, hanno come requisito essenziale una rete in Fibra Ottica ad alta capacità.

L'allacciamento in Fibra della sede di una Amministrazione alla rete Fastweb può avvenire in due modi (vedi Figura):

- **Collegamento in fibra ottica su infrastruttura SDH:** utilizzato quando oltre ai servizi IP è necessario fornire altri servizi quali: la fonia in tecnologia TDM o collegamenti dati punto-punto tra sedi della medesima rete.
- **Collegamento in fibra ottica su IP:** è la modalità standard per collegare sedi in fibra e permette collegamenti a velocità fino ad 1/10 Gbps. Il collegamento in fibra su IP è disponibile oltre che sui PoP Fastweb, anche sulle Centrali equipaggiate con MSAN (multi-service access nodes) e sui Cabinet FTTS, con velocità fino a 100Mbps.

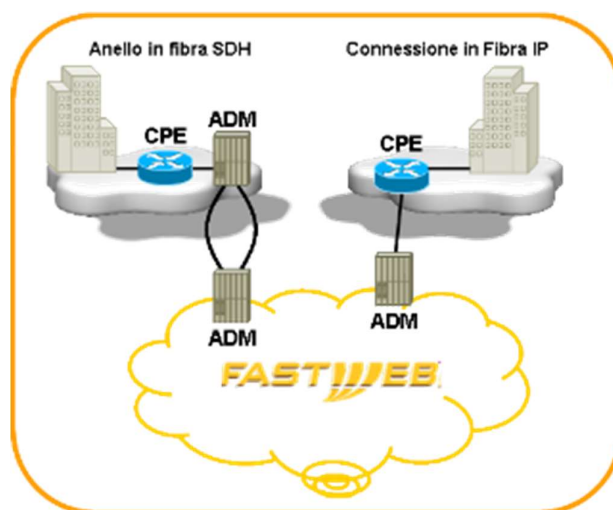

Per aumentare la disponibilità del collegamento in fibra è possibile portare un secondo collegamento in single-homing (da sede Amministrazione a medesimo PoP Fastweb mediante due coppie distinte e diversificate) oppure in dual-homing (da sede Amministrazione verso due PoP Fastweb distinti).


Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	9 / 24

1.3.2 SERVIZI FTTS

La nuova architettura FTTS (Fiber To The Street) prevede l'estensione della rete in Fibra Ottica fino ai Cabinet Fastweb (armadi stradali) in cui sono installati gli apparati di accesso (detti AN, Access Node), in prossimità della sede dell'Amministrazione rispetto al solito alloggiamento in centrale.

La tecnologia FTTS permette di connettere la sede dell'Amministrazione utilizzando una tratta in rame più corta, ovvero la rete secondaria. La riduzione della lunghezza del doppino portata ad una distanza media inferiore ai 400 metri, consente di avere una maggior disponibilità di banda in upstream e downstream tramite la tecnologia VDSL2 (Very high speed Digital Subscriber Line transceivers2).


La nuova tecnologia FTTS permettere di portare servizi integrati di telefonia e connettività con velocità fino a 100/30 Mbps (down/up) e mediante l'utilizzo della tecnologia VDSL Bonding (che sfrutta due doppini), fino a 50Mbps simmetrici. Nella figura è rappresentato lo schema di massima del collegamento FTTS.



1.3.3 SERVIZI VULA

Fastweb è in grado di offrire servizi FTTS anche nelle aree non coperte dai propri cabinet con l'offerta Wholesale FTTCab dell'operatore incumbent.

Il servizio IP in questo caso è gestito completamente da Fastweb mentre il traffico viene consegnato dall'operatore incumbent presso il punto d'interconnessione presenta nella centrale SL che fornisce l'accesso alla rete IP di Fastweb.

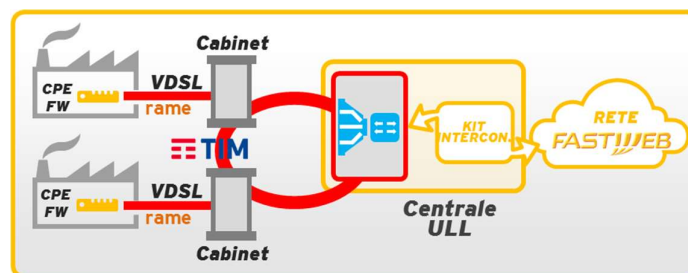


Per la parte di accesso l'offerta Wholesale dell'operatore incumbent è disciplinata da precise direttive regolamentari anti monopolistiche che garantiscono l'applicazione di pari condizioni tecnico/economiche alle divisioni commerciali dell'operatore incumbent e agli operatori concorrenti. Fastweb è in grado di differenziare il proprio servizio grazie alle superiori prestazioni della propria infrastruttura di rete IP.

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	10 / 24

1.3.4 SERVIZI xDSL IN UNBUNDLING FISICO (ULL)

Nelle zone coperte dal servizio di unbundling fisico, Fastweb fornisce accessi in tecnologia DSL su rete ed apparati di proprietà sfruttando il doppino in rame affittato dall'operatore incumbent.

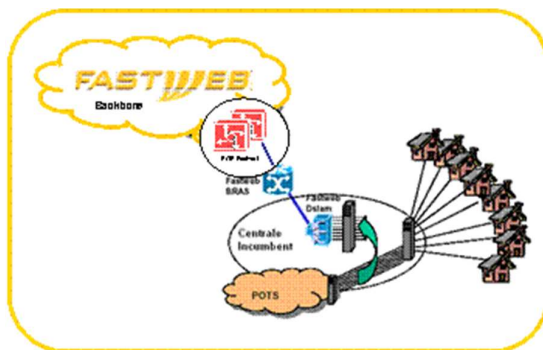

L'accesso su tecnologia DSL impiega la disponibilità di un cablaggio in rame tra le unità immobiliari di una area metropolitana e una centrale dell'operatore incumbent dislocata sul territorio che raccoglie le terminazioni relative ad un bacino di utenza di sedi comprese in un raggio di circa 3 Km.

I doppini provenienti dalle sedi dei clienti sono terminati su permutatori dell'operatore incumbent. Al fine di consentire l'accesso a tali connessioni e renderle disponibili alla connettività Fastweb, l'operatore incumbent rilascia degli spazi in locazione nei quali Fastweb può installare un nodo della propria rete (DSLAM) sul quale viene collegato direttamente il doppino di rame proveniente dalla sede del Cliente.

Dal DSLAM parte una connessione su Fibra Ottica verso il POP Fastweb.

Sono disponibili profili tecnici e commerciali scalabili in funzione delle esigenze del Cliente, ognuno con una quota parte di banda garantita anche in caso di congestione sulla tratta di accesso.

Sul doppino possono essere utilizzate le seguenti tecnologie DSL:

- **SHDSL ATM:** accesso simmetrico su uno o più doppini con bit rate fino a 8 Mbps (su 4 doppini)
- **SHDSL EFM:** accesso simmetrico su uno o più doppini con bit rate fino a 12 Mbps (su 4 doppini)
- **ADSL:** accesso asimmetrico con bit rate fino a 20 Mbps downstream e 1 Mbps upstream su singolo doppino. La velocità effettiva della linea dipende dalla qualità del doppino e dall'area di copertura.

1.3.5 SERVIZI xDSL Fastweb IN BITSTREAM

Fastweb è in grado di offrire i propri servizi a valore aggiunto su scala nazionale anche nelle aree non coperte da fibra e unbundling fisico mediante l'offerta Wholesale xDSL dell'operatore incumbent.

Il servizio IP è in questo caso gestito completamente da Fastweb mentre il traffico viene consegnato dall'operatore incumbent mediante tecnologie ATM o Ethernet che vanno dalla sede del Cliente fino al più vicino punto di raccordo con il backbone Fastweb dove è presente un apparato BRAS che fornisce l'accesso alla rete IP Fastweb.

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	11 / 24



Per la parte di accesso l'offerta Wholesale dell'operatore incumbent è vincolata da precise direttive regolamentari antimonopolistiche che garantiscono l'applicazione di pari condizioni tecnico/economiche alle divisioni commerciali dell'operatore incumbent e agli operatori concorrenti. Fastweb è in grado di differenziare il proprio servizio grazie alle superiori prestazioni della propria infrastruttura di Rete IP.

Sul doppino possono essere utilizzate le seguenti tecnologie DSL:

- **SHDSL/HDSL**: accesso bitstream simmetrico su uno o più doppini con bit rate fino a 8 Mbps;
- **ADSL**: accesso bitstream asimmetrico con bit rate fino a 20 Mbps downstream e 1 Mbps upstream su singolo doppino. La velocità effettiva della linea dipende dalla qualità del doppino e dall'area di copertura.

I servizi HDSL sono chiamati anche CVP (Canale Virtuale Permanente) dal nome storico dell'offerta commerciale Wholesale dell'operatore incumbent.

1.3.6 SERVIZI REALIZZATI CON ALTRE TECNOLOGIE FISSE

Al di fuori delle aree raggiunte dalle reti in Fibra Ottica e dai servizi xDSL (in ULL o bitstream) vengono valutate a progetto tecnologie alternative come, ad esempio, l'utilizzo di linee dati dedicate (CDN, MEF, etc).

1.3.7 SERVIZI REALIZZATI CON TECNOLOGIE SATELLITARI E RADIO

La rete di accesso Fastweb dispone di tecnologie alternative a quelle fisse al fine di perseguire l'obiettivo di aumentare la copertura, l'affidabilità delle architetture di backup e la reattività nei tempi di provisioning. Sia la soluzione Satellitare (prevista dalla convenzione SPC2) che quella mobile si contraddistinguono per gli identici standard di qualità e sicurezza delle soluzioni tradizionali Fastweb.

Tutte le componenti del servizio sono di competenza Fastweb con l'unica eccezione della tratta on air la quale è demandata per il solo trasporto dati (criptato).

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	12 / 24


1.3.8 Rete MPLS

MPLS è il protocollo standardizzato dall'IETF (Internet Engineering Task Force) a partire dal 1997 per la realizzazione di reti dati private virtuali capaci di supportare i nuovi servizi IP in rapida e crescente evoluzione. Al contrario delle tecnologie per VPN IP precedenti, infatti, MPLS garantisce scalabilità, gestibilità, sicurezza.

L'idea alla base dell'architettura MPLS è quella di classificare i flussi di pacchetti in ingresso alla rete riassumendo tutte le informazioni necessarie in una etichetta di lunghezza fissa, detta Label. I router del backbone, che devono analizzare e instradare una enorme quantità di pacchetti, possono quindi limitarsi ad elaborare la Label, con un algoritmo semplice e veloce rispetto all'analisi dell'intera intestazione IP e alla scansione delle tabelle di routing. Ogni router di una rete MPLS, anche chiamato LSR (Label Switch Router), ha una tabella che associa le Label dei pacchetti in ingresso alla interfaccia di uscita e ad una nuova Label. Ogni label ha quindi un significato locale ai router che condividono il link sul quale è usata.

La routing table del backbone MPLS è creata mediante un normale protocollo di routing IP (BGP, OSPF, ecc.), mentre l'associazione coerente delle Label ai flussi di pacchetti su tutti i router del backbone è eseguita mediante un protocollo di distribuzione delle Label detto LDP - Label Distribution Protocol; in queste operazioni MPLS tiene conto non solo dell'indirizzo IP destinazione, come avviene con il normale routing IP, ma anche di altre informazioni quali l'indirizzo IP sorgente, i campi TOS nell'intestazione IP ecc...; è importante sottolineare che la complessità computazionale di questa operazione si riflette con un impatto modesto solo sui router di confine della rete (detti edge LSR – Label Switch Router), senza interessare lo switching dei singoli pacchetti nel backbone.

La seguente figura riassume l'architettura logica di una rete MPLS e il processo di creazione e distribuzione delle Label.

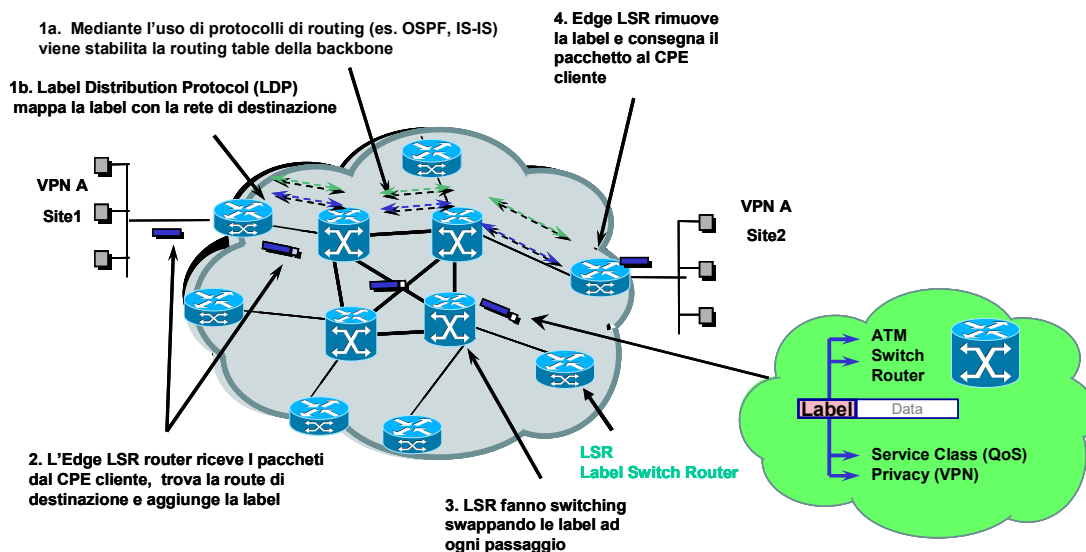

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	13 / 24

Il principale vantaggio di una VPN MPLS rispetto a tecnologie di livello 2 o di VPN tradizionale è la possibilità di configurare reti di tipo Any-To-Any in modo semplice e senza impatti sui CPE. Dal punto di vista logico la rete MPLS dell'operatore è infatti vista dai CPE come se fosse un unico router. Questo permette fra l'altro di adottare su ogni VPN un piano di indirizzamento privato del tutto indipendente da quello delle altre VPN o del backbone. Al contrario, tecnologie di livello 1 o 2 o di tunnelling tradizionali richiedono normalmente l'esplicita configurazione delle singole relazioni punto punto fra ogni coppia di CPE con complessità che cresce esponenzialmente all'aumentare del numero di sedi da collegare in VPN.

Un ulteriore aspetto dell'MPLS è la sicurezza, pari a quella di una rete ATM o FR. La sicurezza nell'MPLS è il risultato di tre componenti:

- **Segretezza:** intercettando un pacchetto IP all'interno del backbone non è possibile ricostruirne la sorgente o la destinazione; infatti le informazioni per l'instradamento del pacchetto sono incluse nella Label che però non contiene l'informazione per l'instradamento end-to-end del pacchetto, ma ha solo un significato locale. L'intestazione IP contenuta all'interno del pacchetto, invece, contiene solo gli indirizzi privati della rete del Cliente, che non hanno alcun significato a livello di indirizzamento globale. Per una maggiore sicurezza dei dati è inoltre possibile implementare cifratura con IPSEC, o con altri protocolli, dei pacchetti inviati sul backbone;
- **Integrità dei dati:** per lo stesso motivo per cui non è possibile ricavare informazioni utili dai pacchetti MPLS nel backbone, non è nemmeno possibile introdurre pacchetti estranei nei flussi dati dei Clienti
- **Controllo degli accessi:** le modalità di configurazione della rete MPLS garantiscono la completa separazione delle diverse VPN configurate sul backbone pubblico. Da ogni VPN è quindi possibile accedere solo agli altri apparati appartenenti alla medesima VPN, ma non al backbone o ad altre VPN. Anche eventuali configurazioni errate o fraudolente degli apparati di un Cliente non possono portare interferenze con gli apparati del backbone o di altri Clienti.

Per tutto quanto sopra MPLS si sta dimostrando il protocollo di elezione per la realizzazione delle reti dati. Per ulteriori dettagli tecnici sulla rete Fastweb si rimanda ai documenti inerenti le Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE/STDO.

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	14 / 24

1.4 Servizi di Supporto Professionale

I Servizi di supporto professionale (SSUP) consentono all'Amministrazione di utilizzare personale altamente specializzato fornito da FASTWEB e riconducibile ad una delle tipologie di servizio previste dal Capitolato Tecnico. Sono previste tre fasi distinte per i servizi di supporto:

- **Supporto alla definizione della strategia di servizio:** include attività utili a raccogliere informazioni sugli asset dell'Amministrazione, a valutare la fattibilità dell'introduzione di un servizio e a valutare i vantaggi ottenibili attraverso l'introduzione del servizio stesso;
- **Supporto all'introduzione del servizio:** include attività che consentono all'Amministrazione di pianificare l'introduzione del servizio e di introdurlo in maniera efficiente ed efficace;
- **Supporto all'operatività del servizio:** include attività che supportano l'Amministrazione nell'utilizzo ottimale del servizio e nell'acquisizione di eventuali certificazioni di conformità a standard e normative.

I servizi SSUP prevedono le seguenti due tipologie di servizio.

1.4.1 Servizi di Supporto specialistico (SSUS)

I Servizi di Supporto Specialistico (SSUS) sono articolati in:

- Supporto al servizio di trasporto (STRA)
- Supporto al servizio di sicurezza (SSIC)
- Supporto al servizio di comunicazione evoluta (SSCE)

Per tutti i SSUP sono previsti tre diversi profili professionali da impiegarsi per l'erogazione dei servizi di supporto specialistico:

- Team Leader
- Specialista Senior
- Specialista

Per ognuno dei singoli servizi di supporto, sono definiti più profili, come di seguito elencato:

- Supporto al servizio di trasporto (STRA-1)
- Supporto alla definizione di reti IPv6 (STRA-2)
- Supporto di base alla sicurezza (SSIC-1)
- Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SSIC-2)
- Incident Management (SSIC-3)
- Business Continuity (SSIC-4);
- Supporto al servizio di comunicazione evoluta (SSCE-1);

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	15 / 24

1.5 Dimensionamento dei Servizi di Trasporto, SBRI, Alta affidabilità ed Erogazione Estesa

Nella pagine successiva è riportato l'elenco completo dei servizi richiesti dall'Amministrazione ed il relativo dimensionamento progettuale per i servizi di connettività [cfr. FW_SPCCONN2_DimensionamentoServizi-x.y], comprensivi degli ultimi aggiornamenti richiesti.

Si ricorda che l'apparato d'accesso fornito con i servizi di trasporto dati per i quali è stata sottoscritta la componente opzionale SBRI-1 Real Time, gestisce il traffico attraverso un meccanismo di accodamento prioritario che, in caso di saturazione della banda associata alla suddetta componente, prevede lo scarto dei pacchetti in eccesso.

In caso di traffico delle componenti SBRI-2 Mission Critical, SBRI-3 Streaming e SBRI-4 Multimedia, viene gestito equamente, e in caso di saturazione delle bande associate alle suddette componenti, viene declassato a traffico Best Effort.

Nella pagina seguente si riporta la tabella di riepilogo dei dati tecnici dei servizi attivi con, evidenziate in **grassetto** ed indicate nelle note con **NEW 5.1**, le due variazioni richieste dall'Amministrazione.

A fianco è riportata anche la tabella dei servizi tecnici dismessi.

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	16 / 24

1.6 Dimensionamento dei Servizi Professionali

Sin dalla prima versione di Progetto ASL Rieti ha contrattualizzato i seguenti servizi Professionali:

INDIRIZZO	Servizio Specialistico	Q.tà Giornate Mese	Servizio Fatturato
VIALE LIONELLO MATTEUCCI 9 RIETI RI	STRA-1 (Servizi di supporto al Trasporto) - Team Leader	1	Network Managed Services
VIALE LIONELLO MATTEUCCI 9 RIETI RI	STRA-1 (Servizi di supporto al Trasporto) - Specialista Senior	2	Network Managed Services
VIALE LIONELLO MATTEUCCI 9 RIETI RI	STRA-1 (Servizi di supporto al Trasporto) - Specialista	7	Network Managed Services

1.7 Modalità di Attivazione

Le modalità di attivazione sono concordate tra il PM.LA di FASTWEB ed i referenti dell'Amministrazione e riportate nella documentazione relativa al Piano di Attuazione [cfr. FW_SPCCONN2_Piano di Attuazione-x.y].

In fase di attivazione, salvo diversi accordi, i servizi oggetto del presente progetto saranno sottoposti a collaudo da parte di Fastweb che rilascerà apposito verbale con indicazione delle prove di collaudo.

Nel caso in cui si rendessero necessari cambiamenti alla pianificazione o alle attivazioni da realizzare, concordate dal Referente dell'Amministrazione e il PM.LA di Fastweb, tali variazioni saranno recepite nei report periodici di avanzamento.

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	18 / 24

2 Condizioni Economiche

Nel presente Capitolo viene riportato il riepilogo dei servizi proposti nel presente Progetto dei Fabbisogni con i relativi costi di attivazione e canoni in applicazione del listino in vigore alla data odierna per i servizi previsti in [cfr. FW_SPCCONN2_DimensionamentoServizi-x.y.].

2.1 Componente di Trasporto dati

Nella seguente tabella riportiamo le condizioni economiche relative ai Servizi di Trasporto, SBRI, Alta affidabilità ed Ergazione Estesa i cui importi indicati in tabella saranno fatturati sino al termine del contratto, a meno di comunicazioni da parte di Consip circa un eventuale adeguamento del listino:

SERVIZIO DI TRASPORTO DATI

Indirizzo	Profilo	STDE/ STDO Contributo Usa Tanium	STDE/ STDO INCREMENTO per AE - FE - Contributo	Profilo Base - Canone Mensile	Incremento per AE - FE - Canone	Multimabito - Canone	Multimabito - INCREMENTO per AE - FE - Canone	Profilo Base INCREMENTO per AE - FE Canone Mese	Back up Radiomobile Canone Mese	Back up Radiomobile INCREMENTO per AE - FE Canone Mese	IP Multimedia Canone Mensile TOTALE	IP Mission Critical Canone Mensile TOTALE	IP RealTime Canone Mensile TOTALE
VIALE MATTEUCCI 9 - RIETI	STDO-1 - 10 M	€ 38,18	€ 40,08	€ 29,37				€ 30,83	€ -	€ -	€ 893,88	€ -	€ -
VIALE MATTEUCCI 9 - RIETI	STDO-4 - 100 M	€ 129,73	€ -	€ 99,79				€ 9,97	€ -	€ -	€ 1.787,76	€ -	€ -
VOCABOLO FILONI 1 - MAGLIANO SABINA	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ -	€ 100,42				€ 10,04	€ -	€ -	€ 382,08	€ -	€ -
VIA FINOCCHETTO 1 - POGGIO MIRTETO	STDO-4 - 100 M	€ 129,73	€ -	€ 99,79				€ 9,97	€ -	€ -	€ 1.787,76	€ -	€ -
VIA DEL TERMINILLO 42 - RIETI	STDO-8 - 1 G	€ 267,80	€ 281,19	€ 206,08	€ 1,00	€ 1,05		€ 216,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VIA DEL TERMINILLO 42 - RIETI	STDO-8 - 1 G	€ 267,80	€ 281,19	€ 206,08				€ 216,38	€ -	€ -	€ 2.991,05	€ -	€ -
VIA DEL TERMINILLO 42 - RIETI	STDO-6 - 300 M	€ 150,15	€ 157,65	€ 115,66				€ 121,44	€ -	€ -	€ 5.672,70	€ -	€ 250,40
VIA PETRIGNANO 12 - PESCOROCCHIANO	STDE-S4 - 2048/2048	€ 43,35	€ -	€ 33,35				€ 3,33	€ -	€ -	€ 95,52	€ -	€ -
CORSO SAN GIUSEPPE 40/B - LEONESSA	STDE-S5 - 4096/4096	€ 67,47	€ -	€ 51,90				€ 5,19	€ -	€ -	€ 191,04	€ -	€ 13,68
VIA DEL TERMINILLO 42 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ -	€ 100,42				€ 10,04	€ 12,04	€ 1,20	€ 382,08	€ -	€ -
VIA FINOCCHETTO 1 - POGGIO MIRTETO	STDE-S4 - 2048/2048	€ 43,35	€ -	€ 33,35				€ 3,33	€ -	€ -	€ 95,52	€ -	€ -
CORSO FORONJOVO 59 - TORRI IN SABINA	STDE-S4 - 2048/2048	€ 43,35	€ 46,38	€ 33,35				€ 35,68	€ -	€ -	€ 95,52	€ -	€ -
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 - ANTRODICO	STDE-S4 - 2048/2048	€ 43,35	€ 46,38	€ 33,35				€ 35,68	€ -	€ -	€ 95,52	€ -	€ -
VIA MONTE BURNO SNC - BORGOROSE	STDE-S4 - 2048/2048	€ 43,35	€ 46,38	€ 33,35				€ 35,68	€ -	€ -	€ 95,52	€ -	€ -
VIALE EUROPA 13 - POGGIO MORANO	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ 133,16	€ 100,42				€ 102,42	€ -	€ -	€ 382,08	€ -	€ 27,36
VIALE PADRE MINOZZI SNC - AMATRICE	STDE-S4 - 2048/2048	€ 43,35	€ -	€ 33,35				€ 3,33	€ -	€ -	€ 95,52	€ -	€ -
CORSO MAZZINI SNC - CITTA DUCALE	STDE-S4 - 2048/2048	€ 43,35	€ 46,38	€ 33,35				€ 35,68	€ -	€ -	€ 95,52	€ -	€ -
VIA CASTELFRANCO SNC - RIETI	STDE-S5 - 4096/4096	€ 67,47	€ 70,16	€ 51,90				€ 53,97	€ -	€ -	€ 191,04	€ -	€ 20,52
VIA SALARA 36 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ 133,16	€ 100,42				€ 102,42	€ -	€ -	€ 382,08	€ -	€ -
VOCABOLO FILONI 1 - MAGLIANO SABINA	STDO-6 - 300 M	€ 150,15	€ -	€ 115,66				€ 115,66	€ -	€ -	€ 2.463,90	€ -	€ 406,20
VIALE MATTEUCCI 9 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ -	€ 100,42				€ 10,04	€ -	€ -	€ 382,08	€ -	€ -
VOCABOLO FILONI 1 - MAGLIANO SABINA	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ -	€ 100,42				€ 10,04	€ -	€ -	€ 382,08	€ -	€ -
VIA GARIBOLDI 17 - FARA IN SABINA	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ 133,16	€ 100,42				€ 102,42	€ -	€ -	€ 382,08	€ -	€ 61,56
VIA FRATELLI SEBASTIANI 221 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ 133,16	€ 100,42				€ 102,42	€ -	€ -	€ 382,08	€ -	€ -
VIA FINOCCHETTO 1 - POGGIO MIRTETO	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ 133,16	€ 100,42				€ 102,42	€ -	€ -	€ 382,08	€ -	€ -
Via Salara Km 142,600 - Accumoli	STDE-A8 - 20480/1024	€ 19,97	€ -	€ 15,36				€ -	€ 12,04	€ -	€ 48,24	€ -	€ -
Via Salara Km 142,600 - Accumoli	STDO-4 - 100 M	€ 129,73	€ -	€ 99,79				€ -	€ -	€ -	€ 1.787,76	€ -	€ 13,68
VIA PADRE MINOZZI SNC - AMATRICE	STDO-4 - 100 M	€ 129,73	€ -	€ 99,79				€ -	€ -	€ -	€ 1.787,76	€ -	€ 20,52
VIALE MAESTRI DEL LAVORO SNC - RIETI	STDO-4 - 100 M	€ 129,73	€ 136,21	€ 99,79				€ 104,77	€ -	€ -	€ 1.787,76	€ -	€ -
VIA SAN FRANCESCO, 56 - CORVARO DI BORGOROSE	STDE-A8 - 20480/1024	€ 19,97	€ -	€ 15,36				€ 1,53	€ 12,04	€ 1,20	€ 48,24	€ -	€ -
VIA SAN PAOLO 1 - FIAMIGNANO	STDE-A8 - 20480/1024	€ 19,97	€ -	€ 15,36				€ 1,53	€ 12,04	€ 1,20	€ -	€ -	€ -
VIA DEL SABOTINO 1 - FIAMIGNANO	STDE-A8 - 20480/1024	€ 19,97	€ -	€ 15,36				€ 1,53	€ 12,04	€ 1,20	€ -	€ -	€ -
VIALE KENNEDY 1 - RIETI	STDO-1 - 10 M	€ 38,18	€ -	€ 29,37				€ 2,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 433,28
VIA PROVINCIALE FINOCCHETTO SNC - POGGIO MIRTETO	STDE-S4 - 2048/2048	€ 43,35	€ -	€ 33,35				€ 3,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 108,32
VIA REGINA MARGHERITA 14 - ASCREA	STDE-A8 - 20480/1024	€ 19,97	€ -	€ 15,36				€ 1,53	€ 12,04	€ 1,20	€ -	€ -	€ -
VIA DEL TERMINILLO, 42 - RIETI	STDE-A8 - 20480/1024	€ 19,97	€ -	€ 15,36				€ 1,53	€ 12,04	€ 1,20	€ -	€ 102,88	€ -
VIA SALARA PER L'AQUILA, 53 - CITTA DUCALE	STDE-A8 - 20480/1024	€ 19,97	€ -	€ 15,36				€ 1,53	€ 12,04	€ 1,20	€ -	€ 102,88	€ -
VIA SALARA PER L'AQUILA, 34 - RIETI	STDE-S4 - 2048/2048	€ 43,35	€ -	€ 33,35				€ 3,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 108,32
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 - ANTRODICO	STDO-1 - 10 M	€ 38,18	€ -	€ 29,37				€ 2,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 789,76
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 17 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ -	€ 100,42				€ 10,04	€ 12,04	€ 1,20	€ 382,08	€ -	€ -
VIALE LIONELLO MATTEUCCI 23 - RIETI	STDE-A8 - 20480/1024	€ 19,97	€ -	€ 15,36				€ 1,53	€ 12,04	€ 1,20	€ 382,08	€ -	€ -
VIA DEL TERMINILLO 63 - RIETI	STDO-4 - 100 M	€ 129,73	€ -	€ 99,79				€ 9,97	€ 12,04	€ 1,20	€ 1.100,16	€ -	€ -

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	19 / 24

Riepilogo Canoni complessivi

NOTE	Indirizzo	Profilo	PREZZO Contributo Una Tantum	PREZZO Canone Mese (Profilo ed Opzioni)	PREZZO Canone Mese (SBR)	PREZZO Canone Mese TOTALE	PREZZO Canone Anno
	VIALE MATTEUCCI 9 - RIETI	STDO-1 - 10 M	€ -	€ 60,20	€ 893,88	€ 954,08	€ 11.448,96
	VIALE MATTEUCCI 9 - RIETI	STDO-4 - 100 M	€ -	€ 109,76	€ 1.787,76	€ 1.897,52	€ 22.770,24
	VOCABOLO FILONI 1 - MAGLIANO SABINA	STDE-S6 - 8192/8192	€ -	€ 110,46	€ 382,08	€ 492,54	€ 5.910,48
	VIA FINOCCHETTO 1 - POGGIO MIRTEO	STDO-4 - 100 M	€ -	€ 109,76	€ 1.787,76	€ 1.897,52	€ 22.770,24
NEW 5.0 - Upgrading internet da 100M ad 1G	VIA DEL TERMINILLO 42 - RIETI	STDO-8 - 1 G	€ -	€ 424,51	€ -	€ 424,51	€ 5.094,12
CED FastCloud Interconnection	VIA DEL TERMINILLO 42 - RIETI	STDO-8 - 1 G	€ -	€ 422,46	€ 2.991,05	€ 3.413,52	€ 40.962,24
	VIA DEL TERMINILLO 42 - RIETI	STDO-8 - 300 M	€ -	€ 237,10	€ 5.923,19	€ 6.160,29	€ 73.923,48
	VIA PETRIGNANO 12 - PESCOROCCHIANO	STDE-S4 - 2048/2048	€ -	€ 36,68	€ 95,52	€ 132,20	€ 1.586,40
	CORSO SAN GIUSEPPE 40B - LEONESSA	STDE-S5 - 4096/4096	€ -	€ 57,09	€ 204,72	€ 261,81	€ 3.141,72
NEW 5.0 - aggiunto LTE a Servizio attivo CED Accesso VoIP	VIA DEL TERMINILLO 42 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ -	€ 123,70	€ 382,08	€ 505,78	€ 6.069,36
CPE non raggiungibile	VIA FINOCCHETTO 1 - POGGIO MIRTEO	STDE-S4 - 2048/2048	€ -	€ 36,68	€ 95,52	€ 132,20	€ 1.586,40
	CORSO FORONUOVO 59 - TORRI IN SABINA	STDE-S4 - 2048/2048	€ -	€ 69,03	€ 95,52	€ 164,55	€ 1.974,60
Upgrading a 8M non possibile - aggiunto link 10M GEA singolo	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 - ANTRODICO	STDE-S4 - 2048/2048	€ -	€ 69,03	€ 95,52	€ 164,55	€ 1.974,60
	VIA MONTE BURNO SNC - BORGOROSE	STDE-S4 - 2048/2048	€ -	€ 69,03	€ 95,52	€ 164,55	€ 1.974,60
	VIALE EUROPA 13 - POGGIO MOIANO	STDE-S6 - 8192/8192	€ -	€ 202,84	€ 400,44	€ 612,28	€ 7.347,36
	VIALE PADRE MINOZZI SNC - AMATRICE	STDE-S4 - 2048/2048	€ -	€ 36,68	€ 95,52	€ 132,20	€ 1.586,40
	CORSO MAZZINI SNC - CITTA' DUCALE	STDE-S4 - 2048/2048	€ -	€ 69,03	€ 95,52	€ 164,55	€ 1.974,60
	VIA CASTELFRANCO SNC - RIETI	STDE-S5 - 4096/4096	€ -	€ 105,87	€ 211,56	€ 317,43	€ 3.809,16
fibra Open Fiber da attivare, poi cessare link rame	VIA SALARIA 36 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ -	€ 202,84	€ 382,08	€ 584,92	€ 7.019,04
	VOCABOLO FILONI 1 - MAGLIANO SABINA	STDO-4 - 300 M	€ -	€ 127,22	€ 2.870,10	€ 2.997,32	€ 35.967,84
	VIALE MATTEUCCI 9 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ -	€ 110,46	€ 382,08	€ 492,54	€ 5.910,48
	VOCABOLO FILONI 1 - MAGLIANO SABINA	STDE-S6 - 8192/8192	€ -	€ 110,46	€ 382,08	€ 492,54	€ 5.910,48
da portare a 8M entrambi i link	VIA GABRIELI 17 - FARA IN SABINA	STDE-S6 - 8192/8192	€ -	€ 202,84	€ 443,64	€ 646,48	€ 7.757,76
backup non attivato (da cliente) in quanto presente MOA	VIA FRATELLI SEBASTIANI 221 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ -	€ 202,84	€ 382,08	€ 584,92	€ 7.019,04
	VIA FINOCCHETTO 1 - POGGIO MIRTEO	STDE-S6 - 8192/8192	€ -	€ 202,84	€ 382,08	€ 584,92	€ 7.019,04
	Via Salaria Km 142.600 - Accumoli	STDE-A8 - 20480/1024	€ -	€ 27,40	€ 48,24	€ 75,64	€ 907,68
	Via Salaria Km 142.600 - Accumoli	STDO-4 - 100 M	€ -	€ 99,79	€ 1.801,44	€ 1.901,23	€ 22.814,76
	VIA PADRE MINOZZI SNC - AMATRICE	STDO-4 - 100 M	€ -	€ 99,79	€ 1.806,28	€ 1.906,07	€ 22.896,84
	VIALE MAESTRI DEL LAVORO SNC - RIETI	STDO-4 - 100 M	€ -	€ 204,56	€ 1.787,76	€ 1.992,32	€ 23.907,84
CORVARO	VIA SAN FRANCESCO, 56 - CORVARO DI BORGOROSE	STDE-A8 - 20480/1024	€ -	€ 30,13	€ 48,24	€ 78,37	€ 940,44
	VIA SAN PAOLO 1 - FIAMIGNANO	STDE-A8 - 20480/1024	€ -	€ 30,13	€ -	€ 30,13	€ 361,56
	VIA DEL SABOTINO 1 - FIAMIGNANO	STDE-A8 - 20480/1024	€ -	€ 30,13	€ -	€ 30,13	€ 361,56
	VIALE KENNEDY 1 - RIETI	STDO-1 - 10 M	€ -	€ 32,30	€ 433,29	€ 465,59	€ 5.589,08
non fattura	VIA PROVINCIALE FINOCCHETTO SNC - POGGIO MIRTEO	STDE-S4 - 2048/2048	€ -	€ 36,68	€ 108,32	€ 145,00	€ 1.740,00
	VIA REGINA MARGHERITA 14 - ASCREA	STDE-A8 - 20480/1024	€ -	€ 30,13	€ -	€ 30,13	€ 361,56
Presidio COVID Rieti	VIA DEL TERMINILLO 42 - RIETI	STDE-A8 - 20480/1024	€ -	€ 30,13	€ 102,88	€ 133,01	€ 1.596,12
Presidio COVID Cittaducale	VIA SALARIAPER LACQUILA, 53 - CITTADUCALE	STDE-A8 - 20480/1024	€ -	€ 30,13	€ 102,88	€ 133,01	€ 1.596,12
	VIA SALARIAPER LACQUILA, 54 - RIETI	STDE-S4 - 2048/2048	€ -	€ 36,68	€ 108,32	€ 145,00	€ 1.740,00
	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 - ANTRODICO	STDO-1 - 10 M	€ -	€ 32,30	€ 898,08	€ 930,38	€ 11.164,56
in 5.0 - ADSL+ con backup LTE e in 5.1 VULA 8M + LTE - Palazzo Dosi	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 17 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ 123,70	€ 382,08	€ 505,78	€ 6.069,36
NEW 5.0 - ADSL+ con backup LTE	VIALE LIONELLO MATTEUCCI 23 - RIETI	STDE-A8 - 20480/1024	€ -	€ 30,13	€ 382,08	€ 412,21	€ 4.946,52
NEW 5.1 - Casa del Buon Pastore	VIA DEL TERMINILLO 63 - RIETI	STDO-4 - 100 M	€ 269,28	€ 123,00	€ 1.100,16	€ 1.223,16	€ 14.677,92
			€ 269,28	€ 123,00	€ 1.100,16	€ 34.514,87	€ 414.178,44

2.2 Componente di Servizi Professionali

Di seguito i Servizi Professionali contrattualizzati dall'Amministrazione e fatturati:

INDIRIZZO	Servizio Specialistico	Q.tà Giornate Mese	Importo Unitario	Ambito Servizio Fatturato	CANONE MENSILE		CANONE ANNUALE	
					TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
VIALE LIONELLO MATTEUCCI 9 RIETI RI	STRA-1 (Servizi di supporto al Trasporto) - Team Leader	1	€ 139,20	Network Managed Services	€ 139,20	€ 1.670,40	€ 1.670,40	€ 1.670,40
VIALE LIONELLO MATTEUCCI 9 RIETI RI	STRA-1 (Servizi di supporto al Trasporto) - Specialista Senior	2	€ 119,32	Network Managed Services	€ 238,64	€ 2.863,68	€ 2.863,68	€ 2.863,68
VIALE LIONELLO MATTEUCCI 9 RIETI RI	STRA-1 (Servizi di supporto al Trasporto) - Specialista	7	€ 99,43	Network Managed Services	€ 696,01	€ 8.352,12	€ 8.352,12	€ 8.352,12
TOTALE COMPLESSIVO					€	1.073,85	€ 12.886,20	€ 12.886,20

Di seguito si riportano i Canoni totali per tipologia di servizio:

Servizi fatturati	Una Tantum	Canone Mese	Canone Anno
Servizi di Trasporto	€ 260,28	€ 34.514,87	€ 414.178,44
Servizi Professionali	€ 0,00	€ 1.073,85	€ 12.886,20
Totale complessivo	€ 260,28	€ 35.588,72	€ 427.064,64

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential - Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consp S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	20 / 24

Per comodità si riportano di seguito i servizi dismessi da ASL Rieti:

SEDE	Indirizzo	Profilo	STDE/STDO Profilo Base Contributo Una Tantum	Profilo Base - INCREMENTO per AE - FE - Contributo	Profilo Base Canone Mese	Multimabito Canone	Multimabito - INCREMENTO per AE - FE - Canone	Profilo Base INCREMENTO per AE - FE - Canone Mese	Back up Radiomobili Canone Mese	Back up Radiomobili INCREMENTO per AE - FE - Canone Mese	IP Multimedia Canone Mensile TOTALE	IP Missioni Critical Canone Mensile TOTALE	IP RealTime Canone Mensile TOTALE
Servizio da cessare	VIALE KENNEDY 1 - RIETI	STDO-4 - 100 M	€ 129,73	€ -	€ 99,79	€ -	€ -	€ 9,97	€ -	€ -	€ 1.787,76	€ -	€ -
Servizio da cessare	VIA DEL TERNINILLO 42 - RIETI	STDO-4 - 100 M	€ 129,73	€ -	€ 99,79	€ -	€ -	€ 9,97	€ -	€ -	€ 1.787,76	€ -	€ -
Servizio da cessare	VIALE KENNEDY 1 - RIETI	STDO-4 - 100 M	€ 129,73	€ 136,21	€ 99,79	€ -	€ -	€ 104,77	€ -	€ -	€ 1.787,76	€ -	€ -
Servizio da cessare dopo attivazione fibra	VOCABOLO FILONI 1 - MAGLIANO SABINA	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ -	€ 100,42	€ -	€ -	€ 10,04	€ -	€ -	€ 382,08	€ -	€ -
Servizio cessato	VIALE KENNEDY 1 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ -	€ 100,42	€ -	€ -	€ 10,04	€ -	€ -	€ 382,08	€ -	€ -
Servizio cessato	VIA DELLA MEDICINA 2 - CORVARO DI BORGOROSE	STDS-3	€ 243,90	€ 12,19	€ 121,95	€ -	€ -	€ 1,20	€ 9,80	€ 1,20	€ -	€ -	€ -
Servizio cessato	VIA SAN PAOLO 1 - FIAMIGNANO	STDS-3	€ 243,90	€ 12,19	€ 121,95	€ -	€ -	€ 1,20	€ 9,80	€ 1,20	€ -	€ -	€ -
Servizio richiesto ma annullato da cliente	VIA BEATO GIOVANNI DA PARMA, SNC - GRECCIO	STDE-A8 - 20480/1024	€ 19,97	€ -	€ 15,36	€ -	€ -	€ 1,53	€ 12,04	€ 1,20	€ -	€ -	€ 102,88
Servizio richiesto ma annullato da cliente	PIAZZALE VETERANI DELLO SPORT, 2 - RIETI	STDE-A8 - 20480/1024	€ 19,97	€ -	€ 15,36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
NEW 5.0 - CESSAZIONE SERVIZIO - Centro Vaccinale Caserma Vindrosi	PIAZZA MARCONI, 7 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ -	€ 100,42	€ -	€ -	€ 10,04	€ 12,04	€ 1,20	€ 382,08	€ -	€ -
NEW 5.0 - CESSAZIONE SERVIZIO - Presidio COVID Amazon	VIALE DELLA MECCANICA, 32 - FARA IN SABINA	STDE-S6 - 8192/8192	€ 130,55	€ -	€ 100,42	€ -	€ -	€ 10,04	€ 12,04	€ 1,20	€ 382,08	€ -	€ -

SEDE	Indirizzo	Profilo	PREZZO Contributo Una Tantum	PREZZO Canone Mese (Profilo ed Opzioni)	PREZZO Canone Mese (SBR)	PREZZO Canone Mese TOTALE	PREZZO Canone Anno	
Servizio da cessare	VIALE KENNEDY 1 - RIETI	STDO-4 - 100 M	€ -	€ 109,76	€ 1.787,76	€ 1.897,52	€ 22.770,24	
Servizio da cessare	VIA DEL TERNINILLO 42 - RIETI	STDO-4 - 100 M	€ -	€ 109,76	€ 1.787,76	€ 1.897,52	€ 22.770,24	
Servizio da cessare	VIALE KENNEDY 1 - RIETI	STDO-4 - 100 M	€ -	€ 204,55	€ 1.787,76	€ 1.992,32	€ 23.907,84	
Servizio da cessare dopo attivazione fibra	VOCABOLO FILONI 1 - MAGLIANO SABINA	STDE-S6 - 8192/8192	€ -	€ 110,46	€ 382,08	€ 492,54	€ 5.910,48	
Servizio cessato	VIALE KENNEDY 1 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ -	€ 110,46	€ 382,08	€ 492,54	€ 5.910,48	
Servizio cessato	VIA DELLA MEDICINA 2 - CORVARO DI BORGOROSE	STDS-3	€ -	€ 134,15	€ -	€ 134,15	€ 1.609,80	
Servizio cessato	VIA SAN PAOLO 1 - FIAMIGNANO	STDS-3	€ -	€ 134,15	€ -	€ 134,15	€ 1.609,80	
Servizio richiesto ma annullato da cliente	VIA BEATO GIOVANNI DA PARMA, SNC - GRECCIO	STDE-A8 - 20480/1024	€ -	€ 30,13	€ 102,88	€ 133,01	€ 1.596,12	
Servizio richiesto ma annullato da cliente	PIAZZALE VETERANI DELLO SPORT, 2 - RIETI	STDE-A8 - 20480/1024	€ -	€ 15,36	€ -	€ 15,36	€ 184,32	
NEW 5.0 - CESSAZIONE SERVIZIO - Centro Vaccinale Caserma Vindrosi	PIAZZA MARCONI, 7 - RIETI	STDE-S6 - 8192/8192	€ -	€ 123,70	€ 382,08	€ 505,78	€ 6.069,36	
NEW 5.0 - CESSAZIONE SERVIZIO - Presidio COVID Amazon	VIALE DELLA MECCANICA, 32 - FARA IN SABINA	STDE-S6 - 8192/8192	€ -	€ 123,70	€ 382,08	€ 505,78	€ 6.069,36	
							€ 8.200,67	€ 98.408,04

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consp S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	21 / 24

2.3 Comunicazione del valore del contratto a Consip

A valle della stipula del contratto esecutivo, verrà inviata all'Amministrazione una comunicazione in cui saranno riportati il valore del Contratto Esecutivo OPA e del Costo Giornaliero. Tali valori sono calcolati in base alla effettiva data di stipula e ai servizi inclusi nel presente progetto ed in accordo alle indicazioni Consip, presenti al seguente link <http://www.consip.it/media/approfondimenti/gare-spc-consip-e-agenda-digitale-italiana-contributi-servizi-contenuti-e-date>.

Di seguito le informazioni che, a cura del Fornitore, saranno inviate a Consip, insieme al costo giornaliero ed al valore del contratto.

[Tabella compilata a cura dell'Amministrazione in fase di approvazione del Progetto/stipula del contratto].

Campo	Valore	Note per la compilazione
CodiceIPA		CODICE UNIVOCO UFFICIO (utilizzato per invio fattura elettronica- www.indicepa.gov.it). Nel caso in cui l'ente non rientri nell'obbligo della fatturazione elettronica il valore dovrà essere XXXXXX
descrizioneIPA		NOME UFFICIO associato al codice univoco ufficio. Nel caso in cui l'ente non rientri nell'obbligo di fatturazione elettronica valorizzare il campo con una X
codiceFiscalePA		Da completare
denominazionePA		Da completare con la ragione sociale
nomecontattoPA		Da completare
pecPA		Da completare

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	22 / 24

3 Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensili

Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale FASTWEB tiene informata l'Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare (dal sopralluogo fino al collaudo finale e la relativa migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e la qualità dei servizi stessi.

A tale scopo FASTWEB metterà in atto un servizio di Project Management consistente nella pianificazione, gestione e verifica delle attività mirate al completamento del progetto. Il project manager del Fornitore si coordinerà con il responsabile di progetto nominato dall'Amministrazione per la definizione ed esecuzione delle attività.

I report saranno prodotti con cadenza mensile in accordo a quanto stabilito [Rif. Contratto esecutivo OPA] e consegnati con atto formale da FASTWEB all'Amministrazione secondo una modalità di comunicazione convenuta con l'Amministrazione in fase di kick off del progetto.

3.1 Report di Stato di Avanzamento Mensile

Per quanto concerne le attività legate alle attività di installazione dei servizi SPC richiesti dall'Amministrazione, il flusso comunicativo può essere sintetizzato come segue:

- il project manager di FASTWEB invia ufficialmente, mediante E-mail, il report SAM all'Amministrazione;
- l'Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il project manager di FASTWEB, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali ritardi verificatisi.
- Il responsabile dell'Amministrazione approva il report mediante comunicazione ufficiale verso FASTWEB.

Il report di Stato di Avanzamento Mensile, contiene, ad esempio, le seguenti informazioni:

- Punti di Accesso Installati
- Attivazione effettuati
- Attivazioni previsti nel mese successivo
- Varianti e Modifiche emersi nel periodo
- Ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	23 / 24

4 Pianificazione Temporale

Per le tempistiche di progetto si faccia riferimento al documento piano di attuazione [FW_SPCCONN2_Piano Attuazione-x.y] allegato al presente documento.

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.A./Consip S.p.A./AgID/ASL Rieti
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni per ASL Rieti - ver 5.1 - Aprile 2022.docx
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	24 / 24
